

Ötlető: SM TERVEZŐ VÁLL.
 Ötletés kezdete: 1977.

TART.: KISBAJOM KOSZUTH U. 144 LAJÓHÁZ

- BONTÁSI TERVE
- ABLAK REKONSTRUKCIÓS TERVE
- FÜSTÖSKONYHA TÜZELŐ BERENDEZÉSINEK REKONSTRUKCIÓS TERVE

- BÍZE - SÜLŐHEGY VÁZLATJAN KÉTES KÁLYHA BAZTA

4 lap, 9 rajz - duplumnak, 3 rajz, 33 foto

FOLDRAJZI MUTATÓ: KISBAJOM
 BÍZE

SARKMUTATÓ: X. 2.
XXXIV

PAPÍRIPARI VÁLLALAT




KISKUNHALASI GYÁRA

LELTÁRKÖZÖS

ATUEZETVE AZ ÉBTS. LTK. 3793-as TÉTELE AL

IV/64/498

BONTÁSI JEGYZÉKÖNYV.



Készült a kisbajomi népi emlékek lakóépület bontási munkái során, 1977. június 28-30-ig.

Kisbajom, Kossuth L. u. 144 szám.

1./ 1977. június 28. kedd.

Jelen vannak:

Rippl Rónai Múzeum részéről:

Sási János
muzeológus
Trunk Károly
régész asszisztens

Juhász György
gk., vezető

őzv. Csitár Ferencné

Volt tulajdonos:

"Zselici Táj" Mg. Tsz. részéről:

Szabó János
Hernat Sándor
Bogdán Sándor
Molnár János
Molnár Imre
Molnár Pál
Tóth Ferenc

Időjárás: meleg, napos idő, szélesend.

A bontási munka előkészítése során a Múzeum kérésére a DÉDÁSZ Nagyatádi Kirendeltsége ársztalanította az épületet és kikapcsolta az utcai hálózatról.

A csupp hájelás leszedése a mai napon koradélelőtt megörtént. Ezalatt a Múzeum dolgozói az alumínium lapokra fekete olajfestékkel felfestették a számokat. A hájelás leszedése után a szerkezet elemeire felszegtették.

Jelölések:

Tl ₁₋₁₂	talpgerenda	13 db:	
O ₁₋₁₉	oszlopok	19 db:	
O ^o - O ^o	kitámasztók	15 db:	
A ₁₋₉	nyílászárók	9 db:	
G ₁₋₉	födéngerendák	10 db:	
M ₁₋₁₀	mestergereidák	3 db:	
K ₁₋₁₅	koszorúgerendák + kötőger.	19 db:	
S ₁₋₁₅	S =	24 db:	/17+7/
	/északi S ^o , déli S/ S ^o =	17 db:	
F ₁₋₃	fogófe	3 db:	
O _S	állóság O _S =	3 db:	
	/északi O _S ^o déli O _S / O _S ^o =	3 db:	

G _{szi-2}	Gerincszelemen	2 db.
S-2	nyitott szin szelomen	1 db.

Összesen: 141 db. elem

Minden fa elem külön jelzést kapott, az azonos, de több darabban lévő elemek*jelzést kaptak.

Az eredeti állapotot rögzítő felmérési anyagot 1:20 léptékben Sási János múzeológus elkészítette. A számozás menetét a helyszínen ezeken a tervlapokon átvezette.

A mai napon érdemleges bontási munka még nem volt, kivéve a déli oldalon a tetőlécozés leszedését.

A számozás és a felmérés atoldalekként készült nyitott színre is vonatkozik, mint meglévő állapotra. Az áttelepítés után ez nyitott szín nem kerül megépítésre. A dokumentációban azonban hiteles felmérése szerepel.

A számozás szarufák vonatkozásában kelet-nyugati irányban növekedve történt, ugyanúgy a főállásoké is.

2./ 1977. június 29. szerda.

Időjárás: meleg naps idő, szélesend.

Mind a Múzeum, mind a Mg. Tsz. részéről 3, illetve 7 fő

Sási János, Trunk Károly, Juhász György, valamint: Szabó János, Bogdán Sándor, Harmat Sándor, Molnár János, Molnár Pál, Tóth Ferenc, Bellei József, Zorényi József.

A fa elemek bontási munkái megindultak.

Először a tetőszerkezet elemeit szedték el és elemfajtánként deponálták az udvaron.

Utána a pedlásfödém sározsása, majd a födémdeszkák következtek /a deszkák számozást nem kaptak, de a helyiségek deszkaanyaga külön deponiában került tárolásra./

A bontási munkával párhuzamosan történt a szalmák festése és felszegezése.

A koszorú és födémgerendák, mestergereidák leemelésé után még sor került az oszlopok, kitémasztók kibontására, amely a falak elbontásával együtt történt. A fal szerkezete karóvázis sárfal volt. A kerók újra nem használhatók már fel. A falak bontása közben befalazott nyílást nem találtak. Az összes ablak utólagosan elhelyezett nyílás /hiányoztak a függőleges oszlopok és kiváltak a tok mellől. Az eredeti nyílások sokkal kisebb méretűek lehettek. A mostani ablakok helyét kivágták a falban és negyméretű téglából körülfalazták, a tokokat. A füstös konyhában eredetileg nem volt ablak/. A kémény utólagosan épült, mellette a szoba felében függőleges téglafalozás 30 cm. szélességben. Az eredeti tűzfalgerendekést már nem találtuk meg.

A talpgerendák számozása kivételével a mai napon minden elem leszámzásra került.
Az elemek számozási sorrendje:

a./ Keszorú és kötőgerendák

K

A keleti homlokzattól kiindulva folyamatosan, az óra járásával megegyező irányban körben, végül a herántfalán keletről nyugatra.

b./ Födéngerendák

G

Mind a három helyiségben délre északi irányban haladva folyamatosan, a szabadban kezdődően.

c./ Mestergerendák

M

Az utcai helyiségtől kezdődően nyugati irányban.

d./ Alapok OSWOPOK

O

Az épület északkeleti sarkától az óramutató járásával megegyező irányban. A kitémasztók az orszlopokkal megegyező számozást kaptak, és " " jelöléssel ellátva.

e./ Nyílászárók /ajtók és ablakok/

A

A keleti homlokzattól kezdődően, óramutató járásával megegyezően kerültek folyamatos számozásra.

3./ 1977. június 30. csütörtök.

Század, borús idő.

Jelen vannak: A Múzeum részéről: Sási János

SOMOGYTERV " Trunk Károly,
L. Szabó Tünde

Mg. Tsz- részéről: Szabó János, Bogdán Sándor,
Hermet Sándor, Molnár János,
Molnár Imre, Molnár Pál,
Zerényi József, Bellei József.

Dél előtt beszámzásra kerültek a talpgerendák + jelöléssel. A számozás a nyugati homlokzaton kezdődött és az óramutató járásával ellentétes irányban folytatódott folyamatosan. - Számozás után bontásra került.-

A füstökonyhában pedlátkutatást végeztünk, de a kemence nyamait és a sárpadka nyamait nem találtuk meg, bolygatatlan döngölt anyagot találtunk csak.

A bontást fényképezésére 1977. július 2-án került sor. A bontási munkák minden fázisát fényképfelvételeken rögzítettük.

A bontott faanyag közepesen jó minőségű. A telepgerendák nagy része korhadt. A faanyag: tölgy és fenyő és berekfa.

Belső berendezési tárgy nem került megvásárlásra.

Megjegyzés:

A bontási jegyzőkönyv együtt kezelendő az 1:20 léptékű tervdokumentációval, a fotódokumentációval és a néprajzi ismertetéssel.

Kecskemét, 1977. július 5.

A jegyzőkönyvet készítették

L. Szabó Tünde sk.

Sási János sk.



BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV.

Készült a kisbajomi népi emlékek lakóépület bontási munkái során, 1977. június 28-30-ig.

Kisbajom, Kossuth L. u. 144. szám.

L./ 1977. június 28. kedd.

Jelen vannak:

Rippl Rónai Múzeum részéről:

Sási János
muzeológus
Trunk Károly
régész asszisztens

Juhász György
gk. vezető

Volt tulajdonos:

őzv. Csitár Ferencné

"Zselici Táj" Mg. Tsz. részéről:

Szabó János
Barnat Sándor
Bogdán Sándor
Molnár János
Molnár Imre
Molnár Pál
Tóth Ferenc

Időjárás: meleg, napos idő, szélcsend.

A bontási munka előkészítése során a Múzeum kérésére a DÉBÁSZ Nagyatádi Kirendeltsége áramtalanította az épületet és kikapcsolta az utcai hálózatról.

A szapp hájelás lezsedése a mai napon karadélelőtt megörtént. Bzaltt a Múzeum dolgozói az alumínium lapokra fekete olajfestékkel felfestették a számokat. A hájelás lezsedése után a szarufa elemekre felszegték.

Jelölések:

El-4-12 talpgerenda	13 db:
Ol - 6-19 oszlopok	19 db:
O ^o - O ^o kitémasztók	15 db:
A ₁ - A ₉ nyílászárók	9 db:
G ₁ - G ₁₀ földéngerendák	10 db:
M ₁ - M ₃ mestengerendák	3 db:
K ₁ - K ₁₅ koszarógerendák + kötőger.	19 db:
S ₁ - S ₆ S =	24 db: /17+7/
/északi S ^o , déli S/ S ^o =	17 db:
F ₁ -F ₃ fogófa	3 db:
O ₁ állóág O =	3 db:
S ₁ /északi O ^o déli O _S / O _S =	3 db:

G _{szl-2}	Gerincszelemen	2 db.
S-2	nyitott szín szelomen	1 db.

Összesen: 141 db. elem

Minden fa elem külön jelzést kapott, az azonos, de több darabban lévő elemek*jelzést kaptak.

Az eredeti állapotot rögzítő felmérési anyagot 1:20 léptékben Sási János múzeológus elkészítette. A számozás menetét a helyszínen ezeken a tervlapokon átvezette.

A mai napon érdemleges bontási munka még nem volt, kivéve a déli oldalon a tetőlécozés leszedését.

A számozás és a felmérés atoldalekként készült nyitott színre is vonatkozik, mint meglévő állapotra. Az áttelepítés után az nyitott szín nem kerül megépítésre. A dokumentációban azonban hiteles felmérése szerepel.

A számozás szarufák vonatkozásában kelet-nyugati irányban növekedve történt, ugyanúgy a főállásoké is.

2./ 1977. június 29. szerda.

Időjárás: meleg naps idő, szélesend.

Mind a Múzeum, mind a Mg. Tsz. részéről 3, illetve 7 fő

Sási János, Trunk Károly, Juhász György, valamint: Szabó János, Bogdán Sándor, Harmat Sándor, Molnár János, Molnár Pál, Tóth Ferenc, Bellei József, Zorényi József.

A fa elemek bontási munkái megindultak.

Először a tetőszerkezet elemeit szedték el és elemfajtánként deponálták az udvaron.

Utána a pedlászfödém sározsása, majd a födémdeszkák következtek /a deszkák számozást nem kaptak, de a helyiségek deszkaanyaga külön deponiában került tárolásra./

A bontási munkával párhuzamosan történt a szalmák festése és felszegezése.

A koszorú és födémgerendák, mestergereidák leemelése után még sor került az oszlopok, kitémasztók kibontására, amely a falak elbontásával együtt történt. A fal szerkezete karóvázis sárfal volt. A kerók újra nem használhatók már fel. A falak bontása közben befalazott nyílást nem találtak. Az összes ablak utólagosan elhelyezett nyílás /hiányoztak a függőleges oszlopok és kiváltak a tok mellől. Az eredeti nyílások sokkal kisebb méretűek lehettek. A mostani ablakok helyét kivágták a falban és negyméretű téglából körülfalazták, a tokokat. A füstös konyhában eredetileg nem volt ablak/. A kémény utólagosan épült, mellette a szoba felében függőleges téglafalozás 30 cm. szélességben. Az eredeti tűzfalgerendekést már nem találtuk meg.

A talpgerendák számozása kivételével a mai napon minden elem leszámzásra került.

Az elemek számozási sorrendje:

a./ Keszorú és kötőgerendák

K

A keleti homlokzattól kiindulva folyamatosan, az óra járásával megegyező irányban körben, végül a herántfalán keletről nyugatra.

b./ Födéngerendák

G

Mind a három helyiségben délről északi irányban haladva folyamatosan, a szabadban kezdődően.

c./ Mestergerendák

M

Az utcai helyiségtől kezdődően nyugati irányban.

d./ Alapok OSWOPOK

O

Az épület északkeleti sarkától az óramutató járásával megegyező irányban. A kitémasztók az orszlopokkal megegyező számozást kaptak, és " " jelöléssel ellátva.

e./ Nyílászárók /ajtók és ablakok/

A

A keleti homlokzattól kezdődően, óramutató járásával megegyezően kerültek folyamatos számozásra.

3./ 1977. június 30. csütörtök.

Száraz, borús idő.

Jelen vannak: A Múzeum részéről: Sási János

SOMOGYTERV " Trunk Károly,
L. Szabó Tünde

Mg. Tsz- részéről: Szabó János, Bogdán Sándor,
Hermet Sándor, Molnár János,
Molnár Imre, Molnár Pál,
Zerényi József, Bellei József.

Dél előtt beszámzásra kerültek a talpgerendák + jelöléssel. A számozás a nyugati homlokzaton kezdődött és az óramutató járásával ellentétes irányban folytatódott folyamatosan. - Számozás után bontásra került.-

A füstökonyhában pedláktatást végeztünk, de a kemence nyamait és a sárpadka nyamait nem találtuk meg, bolygatatlan döngölt anyagot találtunk csak.

A bontott faanyag elszállítására 1977. július 2-án került sor. A bontási munkák minden fázisát fényképfelvételeken rögzítettük.

A bontott faanyag közepesen jó minőségű. A telepgerendák nagy része korhadt. A faanyag: tölgy és fenyő és berekfa.

Belső berendezési tárgy nem került megvásárlásra.

Megjegyzés:

A bontási jegyzőkönyv együtt kezelendő az 1:20 léptékű tervdokumentációval, a fotódokumentációval és a néprajzi ismertetéssel.

Kecskemét, 1977. július 5.

A jegyzőkönyvet készítették

L. Szabó Tünde sk.


Sási János sk.







101641522

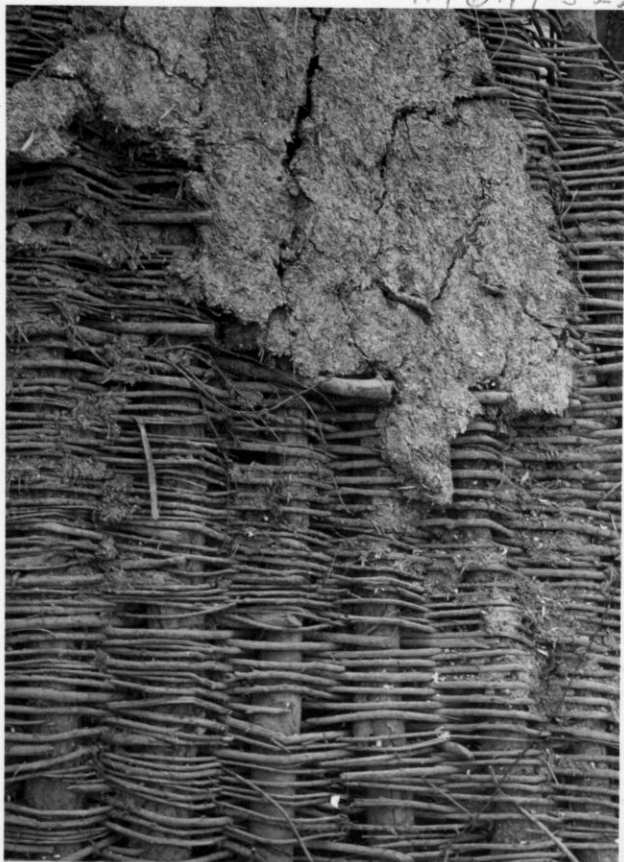

w/eh/523



W1641524



W/64/525















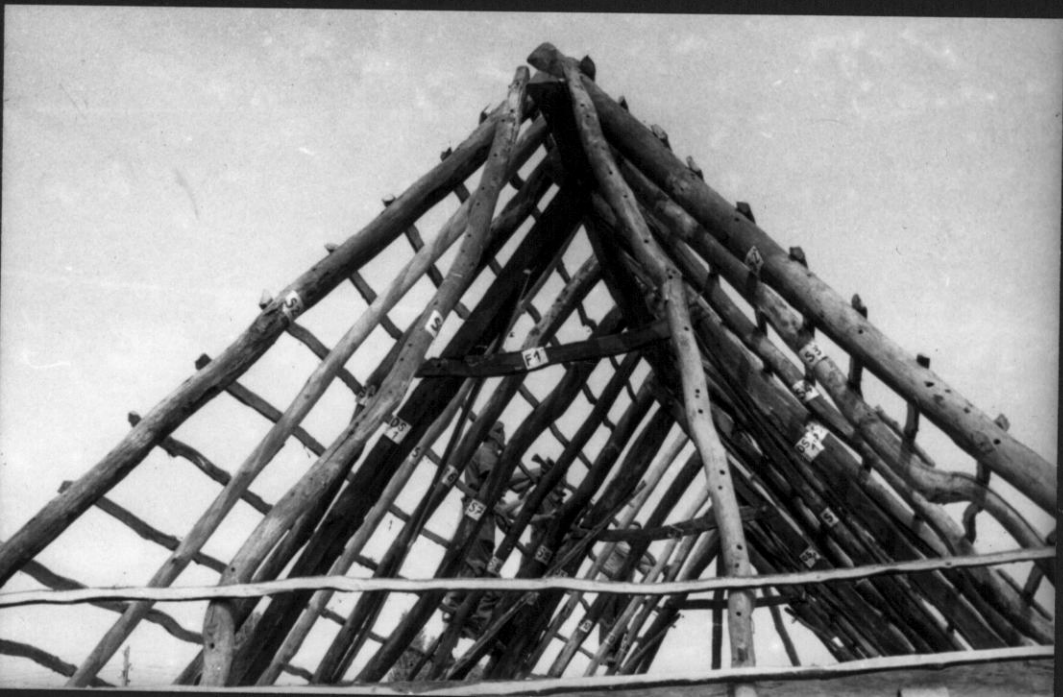



14/64/533

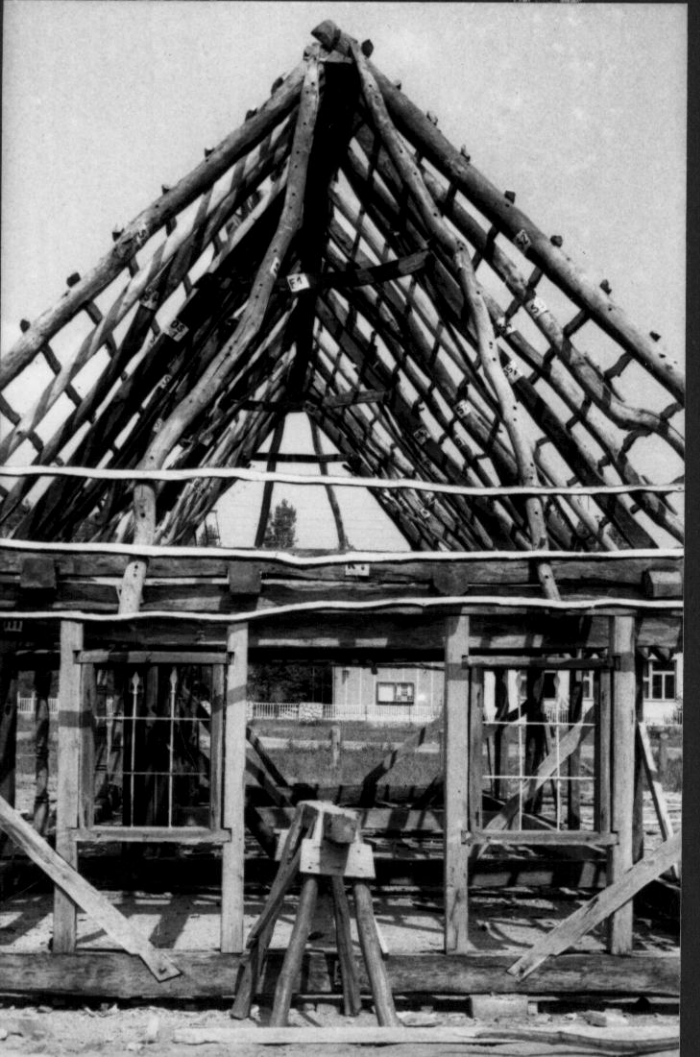

IV/64/1934



